


Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. budowy drogi S12



7 lutego 2023 r.



Droga ekspresowa S12 – odcinki w przygotowaniu

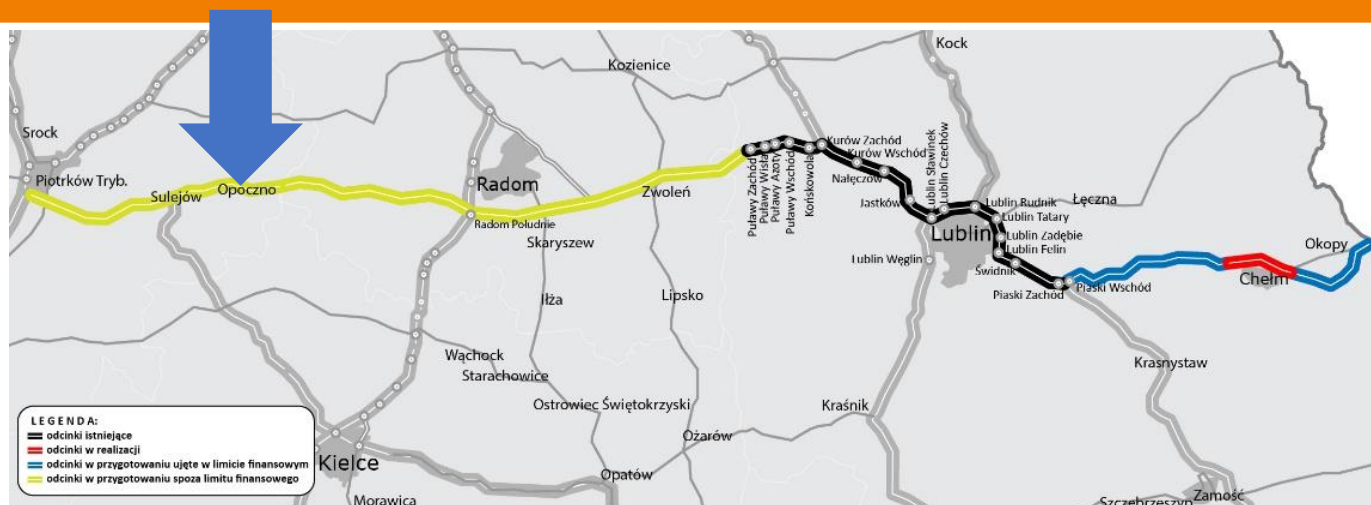

Piotrków Trybunalski - granica województwa łódzkiego / mazowieckiego

Długość 61,2 km

Etap realizacji: Przygotowanie - aktualizacja STEŚ

25.04.2013 r. - złożenie wniosku o DŚU

30.05.2019 r. - wydanie DŚU

22.05.2020 r. - wezwanie GDOŚ - konieczność aktualizacji dokumentacji środowiskowej

19.10.2022 r. - zawarcie umowy z Wykonawcą

15.05.2024 r. - termin realizacji umowy

Wykonywanie inwentaryzacji przyrodniczej. Analiza przebiegu drogi pod kątem zmiany przepisów techniczno-budowlanych w zakresie dróg.

Droga ekspresowa S12 – odcinki w przygotowaniu

granica województwa łódzkiego

Długość 41,3 km

Etap realizacji: Przygotowanie –
w opracowaniu STEŚ-R

System realizacji: P&B

Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Multiconsult Polska Sp. z o.o.

19.12.2019 r. - złożenie wniosku o DŚU

25.10.2021 r. - uzyskania DŚU

10.01.2023 r. - ostateczność DŚU (po rozpatrzeniu dwóch odwołań)

III kwartał 2023 r. - zakończenie STEŚ-R

Planowany podział na odcinki realizacyjne:

Odcinek I gr. woj. łódzkiego / mazowieckiego węzeł Gielniów (z węzłem) - węzeł Przysucha (bez węzła)


Odcinek II węzeł Przysucha (z węzłem) - węzeł Wieniawa (z węzłem)

Odcinek III węzeł Wieniawa (bez węzła) - węzeł Radom (bez węzła)

Planowane ogłoszenie przetargu PiB:

IV kwartał 2023 r. - odcinki I i II


IV kwartał 2025 r. - odcinek III



Droga ekspresowa S12 – odcinki w przygotowaniu

granica województwa łódzkiego / mazowieckiego

węzeł Radom Południe (bez węzła)



Odcinek realizacyjny I

granica województwa łódzkiego / mazowieckiego węzeł Gielniów (z węzłem) - węzeł Przysucha

(bez węzła)

długość ok. 14,5 km



Odcinek realizacyjny II

węzeł Przysucha (z węzłem) - węzeł Wieniawa (z węzłem)

długość ok. 15 km



Droga ekspresowa S12 – odcinki w przygotowaniu


węzeł Radom Południe (z węzłem) – Puławy (węzeł Bronowice na obwodnica Puław)

Długość 67 km

Etap realizacji: Przygotowanie –
w opracowaniu STEŚ-R

System realizacji: P&B

Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Schuessler Plan Inżynierzy Sp. z o.o.



II kwartał 2024 r. - uzyskanie DŚU

IV kwartał 2025 r. - ogłoszenie przetargu P&B

(w przypadku ciągłości finansowania, aktualnie finansowanie tylko na prace przygotowawcze):

10.03.2021 r. – złożono wniosek o wydanie DŚU

19.07.2021 r. – pismo RDOŚ o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania

25.08.2021 r. – GDDKiA nie zgadza się ze stanowiskiem RDOŚ - wniosek o reasumpcję
zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania

25.08.2021 r. – przekazanie do RDOŚ ponaglenia na bezczynność w sprawie

27.08.2021 r. – odpowiedź RDOŚ na wniosek o reasumpcję


07.09.2021 r. – postanowienie GDOŚ o uznaniu ponaglenia jako niezasadnego

Droga ekspresowa S12 – odcinki w przygotowaniu

węzeł Radom Południe (z węzłem) – Puławy (węzeł Bronowice na obwodnica Puław)

Długość 67 km

Etap realizacji: Przygotowanie –
w opracowaniu STEŚ-R



11.10.2021 r. – złożono **ponowny** wniosek o wydanie DŚU

21.10.2021 r. – obwieszczenie Regionalnego Dyrektora o wszczęciu postępowania

25.11.2021 r. – wezwanie merytoryczne Regionalnego Dyrektora do uzupełnienia materiałów przekazanych wraz z wnioskiem o wydanie DŚU

22.11.2022 r. – przekazano do RDOŚ materiały uzupełnione zgodnie z wezwaniem merytorycznym organu (w wyniku prowadzonych z Projektantem mediacji przed Sądem Polubownym PGRP)

22.12.2022 r. – wezwanie RDOŚ z 16.12.2022 r. do uzupełnienia

27.12.2022 r. – przekazano do RDOŚ uzupełnione materiały

31.01.2023 r. – wezwanie RDOŚ z 26.01.2023 r. do uzupełnienia

Aktualnie – uzupełnianie materiałów do wniosku o wydanie DŚU zgodnie z wezwaniem organu.

Droga ekspresowa S12 – odcinki w przygotowaniu

Piaski (koniec obwodnicy) – obiekt WD-08

Długość 9,8 km


Etap realizacji: przetarg

System realizacji: P&B

02.06.2022 r. - odbiór KP

20.09.2022 r. - ogłoszenie przetargu

II kwartał 2023 r. – planowana data
zawarcia umowy

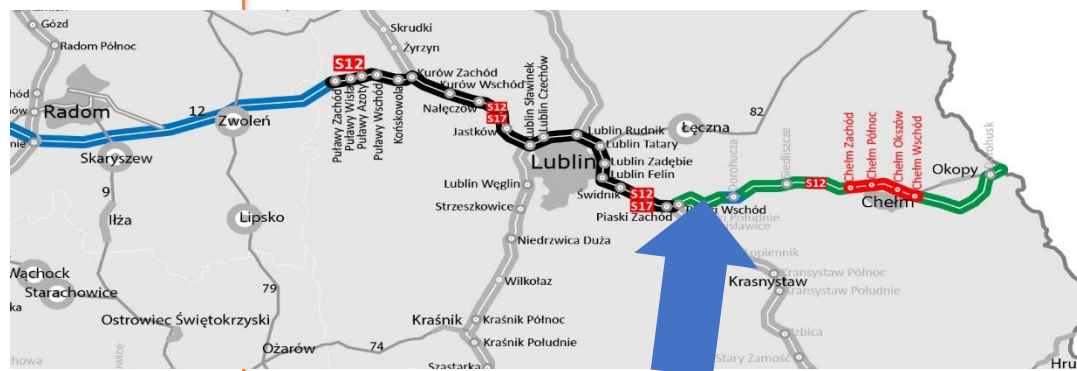

Droga ekspresowa S12 – odcinki w przygotowaniu

**Obiekt WD-08 (bez obiektu) – obiekt
WD-15 (bez obiektu)**

Długość 5,6 km


Etap realizacji: przygotowanie

20.12.2022 r. - ogłoszenie przetargu
na STEŚ-R wraz z materiałami
do uzyskania DŚU

06.02.2023 r. - otwarcie ofert

II kwartał 2023 r. – planowana data
podpisania umowy

06.08.2026 r. - odbiór STEŚ-R

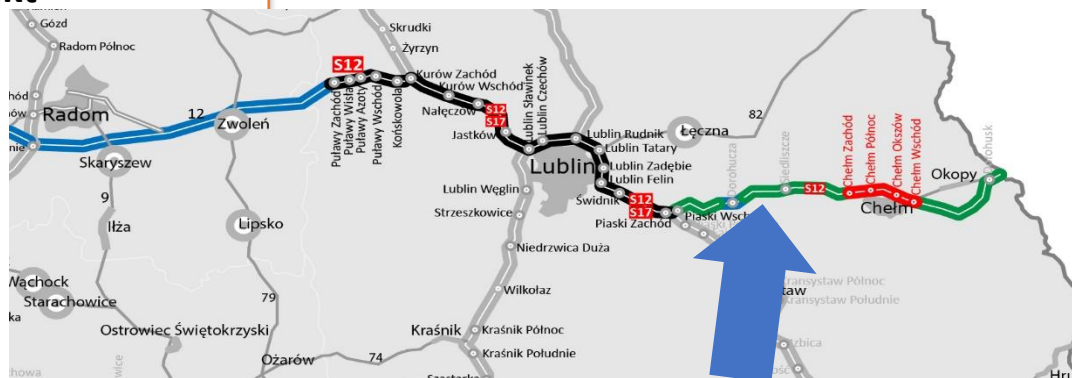

Droga ekspresowa S12 – odcinki w przygotowaniu

Obiekt WD-15 - Chełm (w. Chełm Zachód bez węzła)

Długość 22,3 km


Etap realizacji: przetarg

System realizacji: P&B

06.07.2022 r. - odbiór KP

20.09.2022 r. - ogłoszenie przetargu

II kwartał 2023 r. – planowana data zawarcia umowy

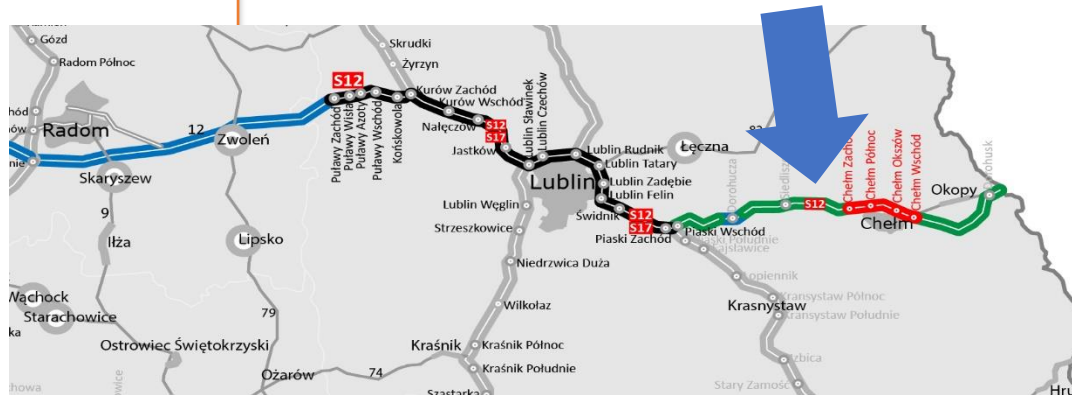

Droga ekspresowa S12 – odcinki w przygotowaniu

Budowa obwodnicy Chełma w ciągu S12

Długość 13,6 km

Etap realizacji: Realizacja


System realizacji: P&B

Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Mosty Katowice Sp. z o.o.

Wykonawca robót: Strabag Sp. z o.o.

14.06.2021 r. podpisanie umowy

14.04.2022 r. złożenie wniosku o ZRID

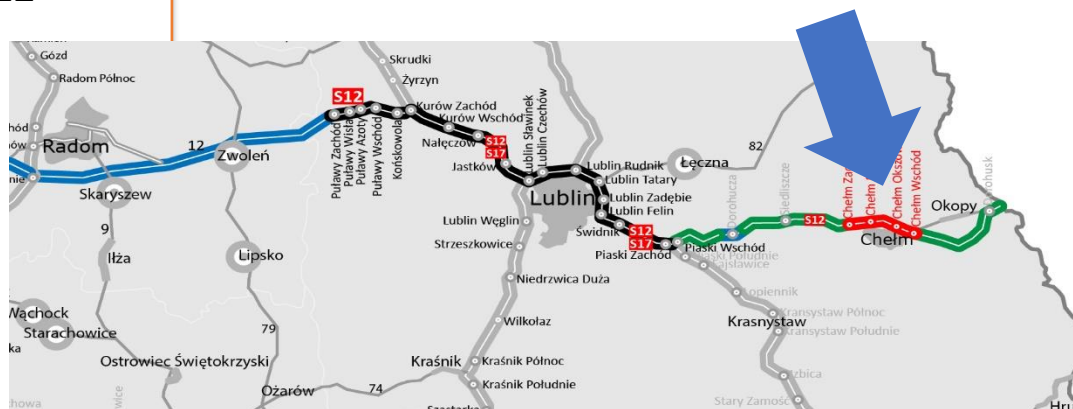

Droga ekspresowa S12 – odcinki w przygotowaniu

Chełm (w. Chełm Wschód - bez węzła) – Dorohusk


Długość 23 km

Etap realizacji: przetarg

System realizacji: P&B

26.08.2022 r. - ogłoszenie przetargu

II kwartał 2023 r. – planowane zawarcie umowy z Wykonawcą

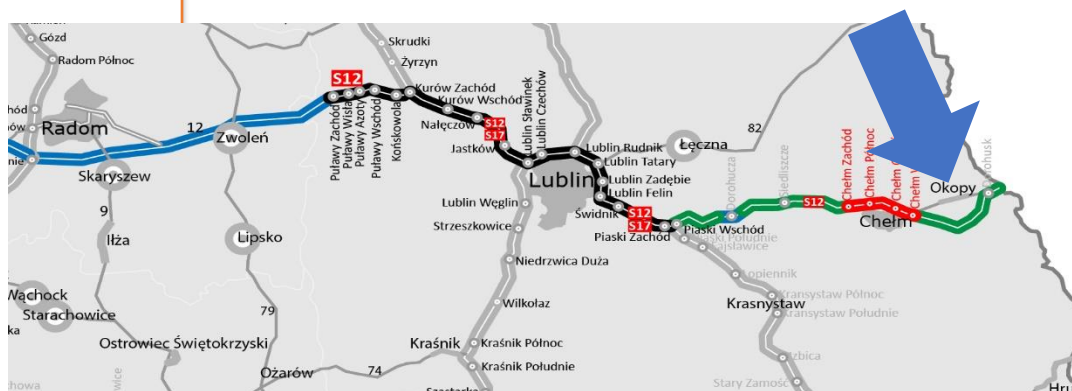



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
tel. 22 375 88 88
e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl

www.gddkia.gov.pl

www.facebook.com

www.twitter.com/gddkia



Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
